


柏崎刈羽原子力発電所1号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機能試験に係る進捗状況

別紙

平成22年6月7日
東京電力株式会社

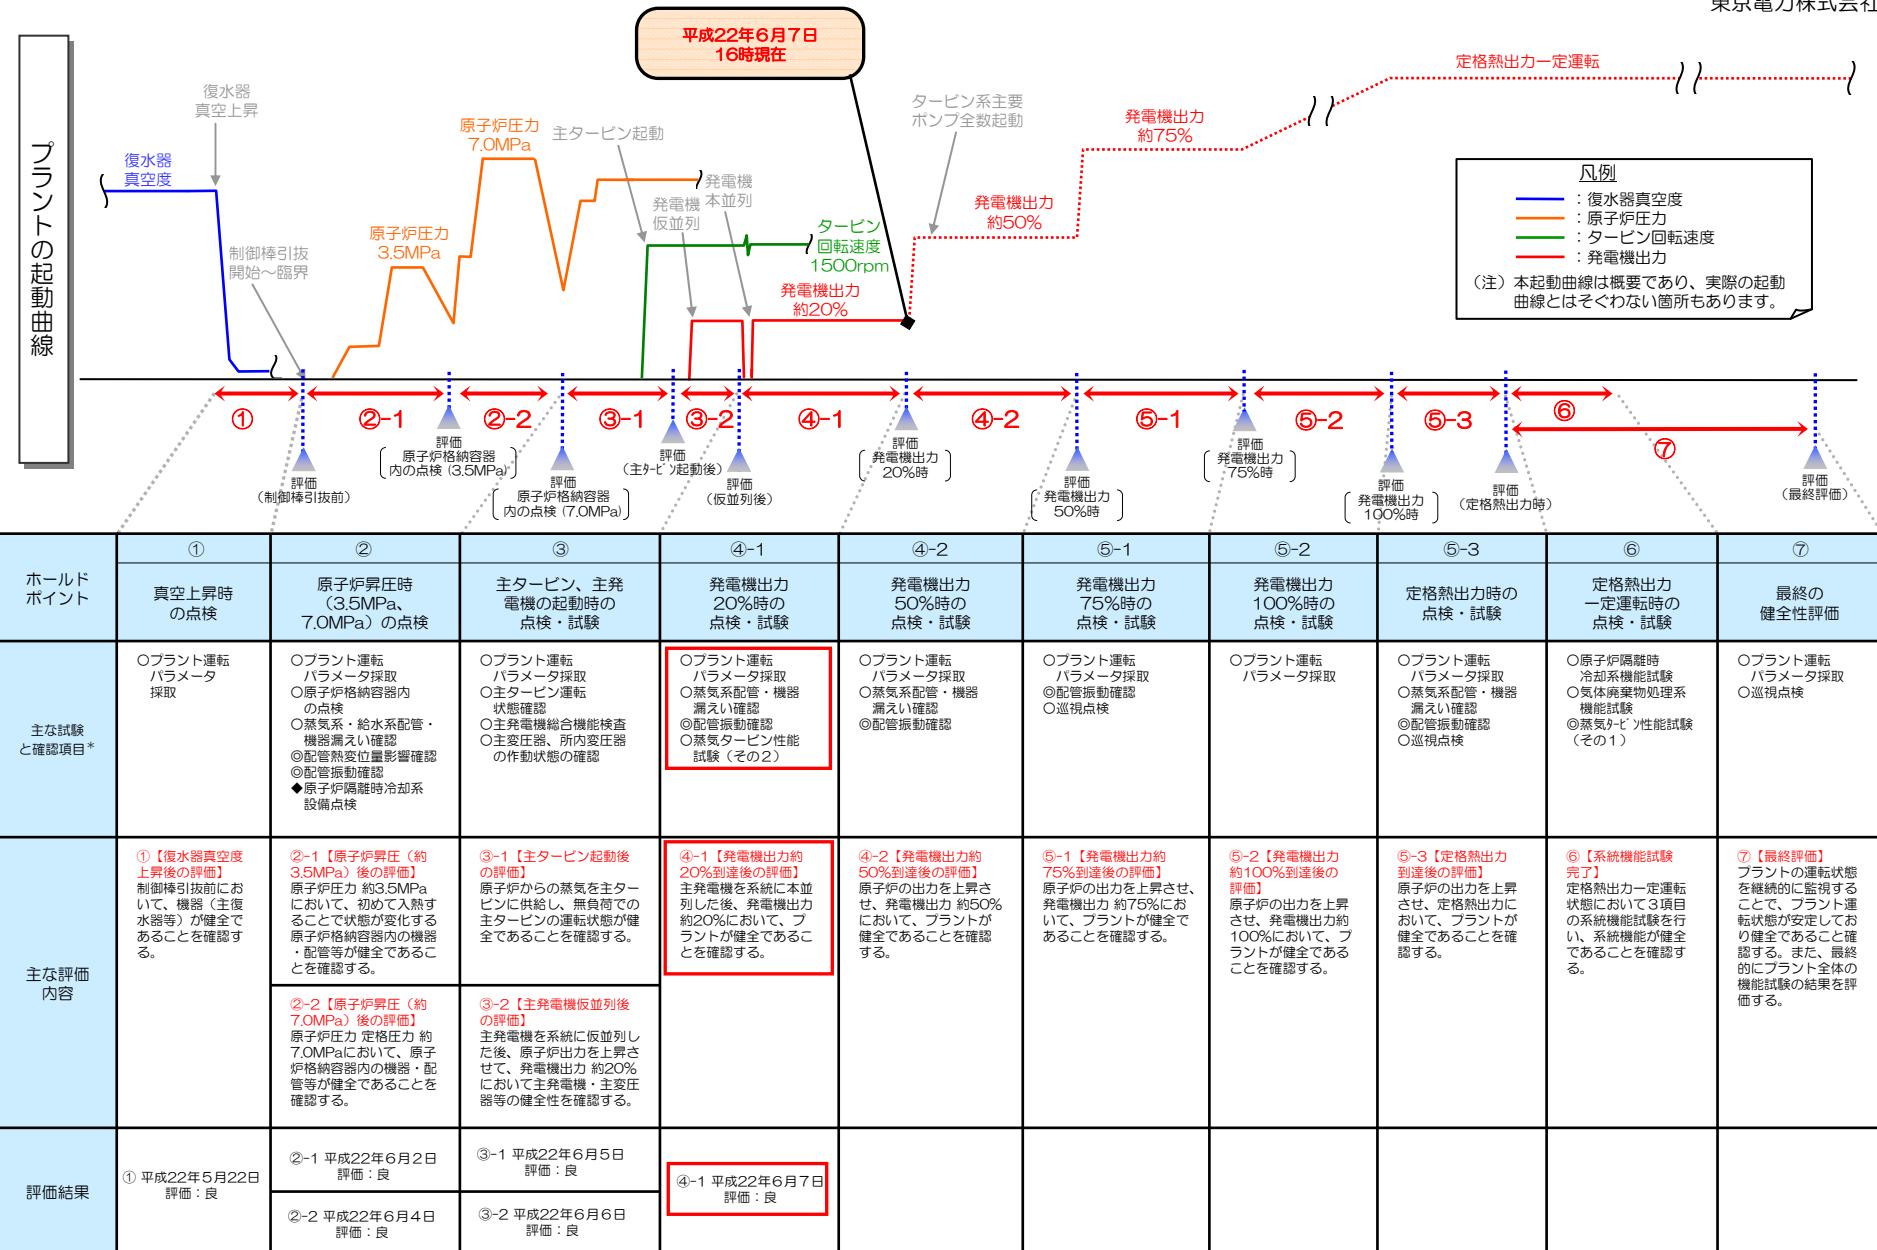

東京電力

* 凡例

- ◎: 地震後の健全性確認のため、特別に実施する項目
- : 通常のプラント起動時に加え地震後の健全性確認のため、内容・範囲等を追加した項目
- ◆: 通常のプラント起動時にも実施している項目

□ : 前回お知らせ(平成22年6月6日)からの進捗箇所

評価結果 ④-1 発電機出力約20%到達後の評価

平成22年6月7日 評価完了：良

< 主な評価内容 >


主発電機を系統に本並列した後、発電機出力 約20%において、プラントが健全であることを確認する。

< 主な試験・確認項目 >

プラント運転パラメータ採取、蒸気系配管・機器漏えい確認、配管振動確認、蒸気タービン性能試験（その2）等

< 次工程 >

原子炉の出力を上昇させ、発電機出力を約50%にする。

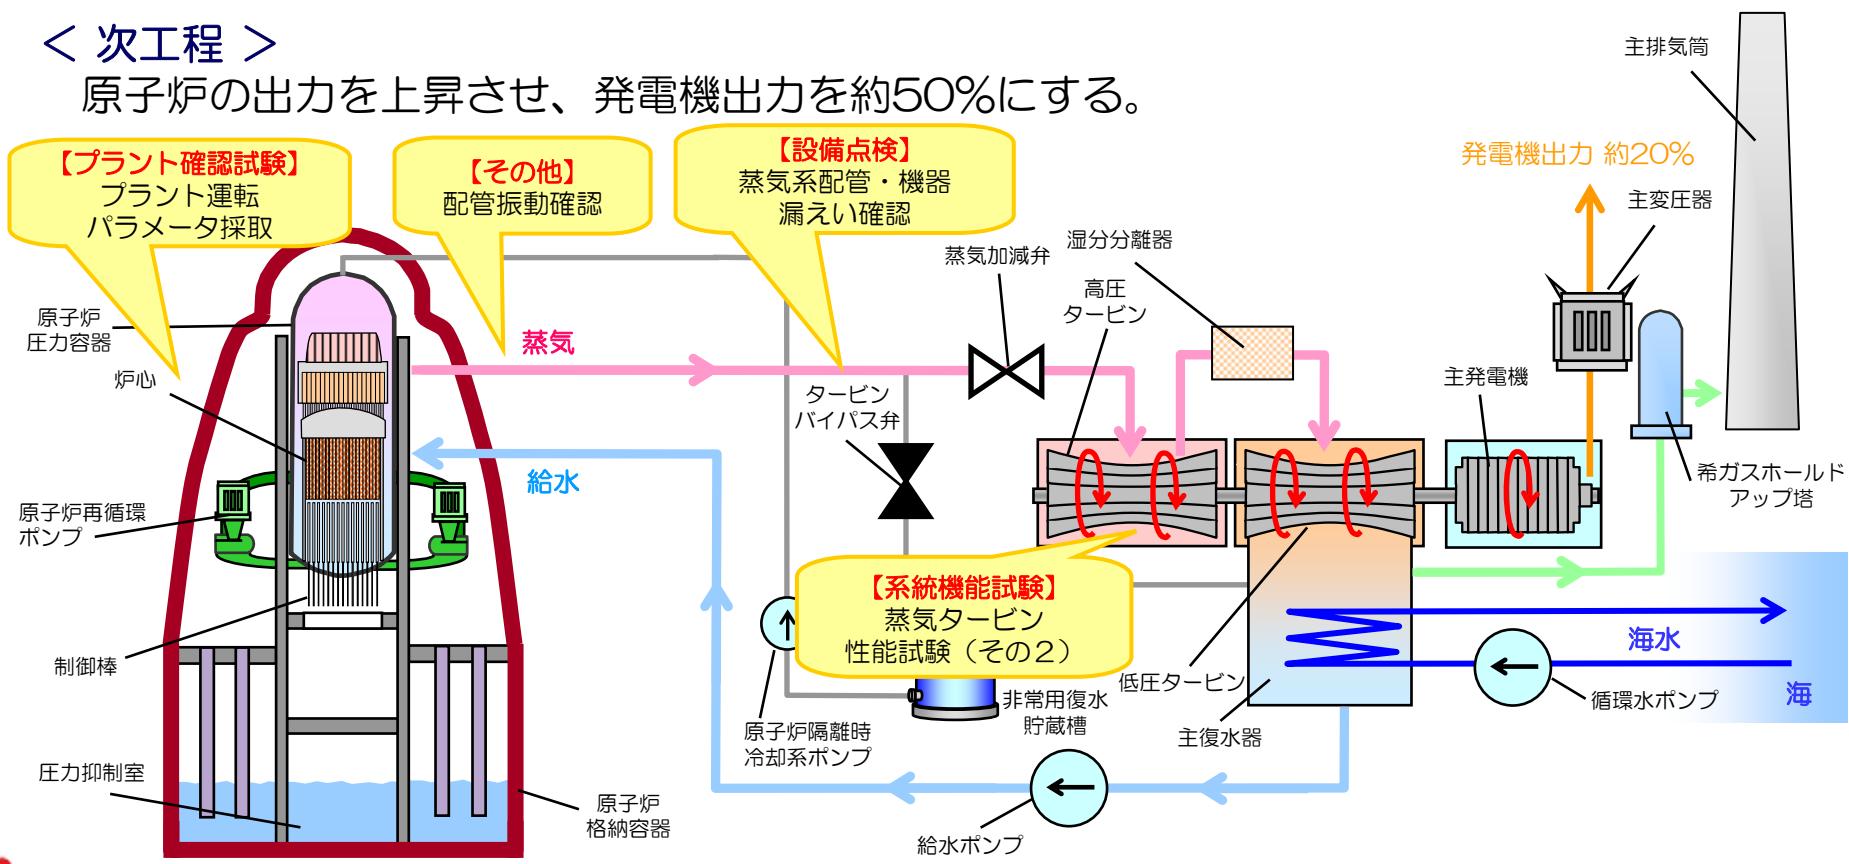

次工程 ④-2 発電機出力約50%到達後の評価

< 主な評価内容 >

原子炉の出力を上昇させ、発電機出力 約50%において、プラントが健全であることを確認する。

< 主な試験・確認項目 >

プラント運転パラメータ採取、蒸気系配管・機器漏えい確認、配管振動確認 等

