


分野名	共同中長期実行プラン2024 目標工程	活 り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	12月		1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月 以降			備 考						
					22	29		5	12	19	26		2	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中		下					
使用済燃料 プール対策	●1号機大型カバーの 設置完了(2023年度 済) ●1号機燃料取り出し の開始(2027～ 2028年度) ●2号機燃料取り出し の開始(2024～ 2026年度) ●1～6号機燃料取り 出し完了(2031年 内)	カ バ ー	燃料取り出し用カバー の詳細設計の検討 原子炉建屋上部の ガレキの撤去 燃料取り出し用カバー の設置工事	1号機 (実 績) ・大型カバー、ガレキ撤去の検討・設計 ・現地調査等 ・作業ヤード整備 ・本体鉄骨(上部架構)設置 ・R/B外周鉄骨撤去 ・【構内】大型カバー換気設備他設置工事 (予 定) ・大型カバー、ガレキ撤去の検討・設計 ・現地調査等 ・作業ヤード整備 ・本体鉄骨(上部架構)設置 ・R/B外周鉄骨撤去 ・【構内】大型カバー換気設備他設置工事	検討・ 設計	大型カバー、ガレキ撤去の検討・設計																												
					①現地調査等(‘13/7/25～)																													
					②作業ヤード整備、構外ヤード地盤、R/B外周鉄骨撤去等																													
					③本体鉄骨建方等																													
					④【構内】大型カバー換気設備他設置工事																													
		2号機	(実 績) ・【構外】ランウェイガーダ設置 (鉄骨地組) ・R/B南側外壁開口設置 (準備作業含む) ・【構内】ランウェイガーダ設置 (予 定) ・【構外】ランウェイガーダ設置 (鉄骨地組) ・【構内】ランウェイガーダ設置	現場 作業	【構外】ランウェイガーダ設置(鉄骨地組)																													
				⑤【構内】ランウェイガーダ設置(周辺設備含む)																														
燃料 取扱 設備	クレーン/燃料取扱機 の設計・製作 プール内ガレキの撤 去、燃料調査等	1号機	(実 績) ・燃料取り出し設備の検討・設計・製作 (予 定) ・燃料取り出し設備の検討・設計・製作	検討・ 設計	燃料取り出し設備の検討・設計・製作																													
		2号機	(実 績) ・燃料取り出し設備の検討・設計・製作 (予 定) ・燃料取り出し設備の検討・設計・製作	検討・ 設計	燃料取り出し設備の検討・設計・製作・梱包・輸送																													
	クレーン/燃料取扱機 の設置	2号機	(実 績) (予 定) ・燃料取扱設備の設置・試運転	現場 作業																													⑥燃料取扱設備設置/試運転 (2025年度夏頃完了予定)	
	燃料 取り 出し	6号機使用済燃料の搬 出	6号機	(実 績) ・使用済燃料搬出 (予 定) ・使用済燃料搬出	現場 作業	使用済燃料搬出作業																												
共用 プ ー ル	燃料受け入れ	(実 績) ・使用済燃料受け入れ (予 定) ・使用済燃料受け入れ	現場 作業	使用済燃料受け入れ作業																														
	乾式キャスク製作	(実 績) ・乾式キャスク製作・検査 (予 定) ・乾式キャスク製作・検査	調 達	乾式キャスク製作・検査																														
			継続製作中																															
	共用プール空き容量確保 (既設仮保管設備受入)	(実 績) ・乾式キャスク搬出作業 ・乾式キャスク仮保管設備エリア増設 (予 定) ・乾式キャスク搬出作業 ・乾式キャスク仮保管設備エリア増設	現場 作業	乾式キャスク搬出作業																														
			乾式キャスク仮保管設備エリア増設工事																															
	乾式保管設備(共用プール 用) 検討・設計・設置工事	(実 績) ・乾式保管設備(共用プール用) 検討 (予 定) ・乾式保管設備(共用プール用) 検討	検討・ 設計	乾式保管設備(共用プール用) 検討																														
			継続検討中																															
高 線 量 機 器 取 り 出 し	制御棒等高線量機器 取り出し	3号機	(実 績) ・高線量機器取り出し方法の検討 ・プール内ガレキ撤去 (予 定) ・高線量機器取り出し方法の検討 ・プール内ガレキ撤去 ・高線量機器取り出し	検討・ 設計	高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作																													
				⑥-1 プール内ガレキ撤去準備・ガレキ撤去																														
				⑥-2 高線量機器取り出し																														
		4号機	(実 績) ・高線量機器取り出し方法の検討 (予 定) ・高線量機器取り出し方法の検討 ・高線量機器取り出し	現場 作業	高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作																													
				⑦-1 高線量機器取り出し準備																														
⑦-2 高線量機器取り出し																																		

工程の細分化

廃炉中長期実行プラン2024

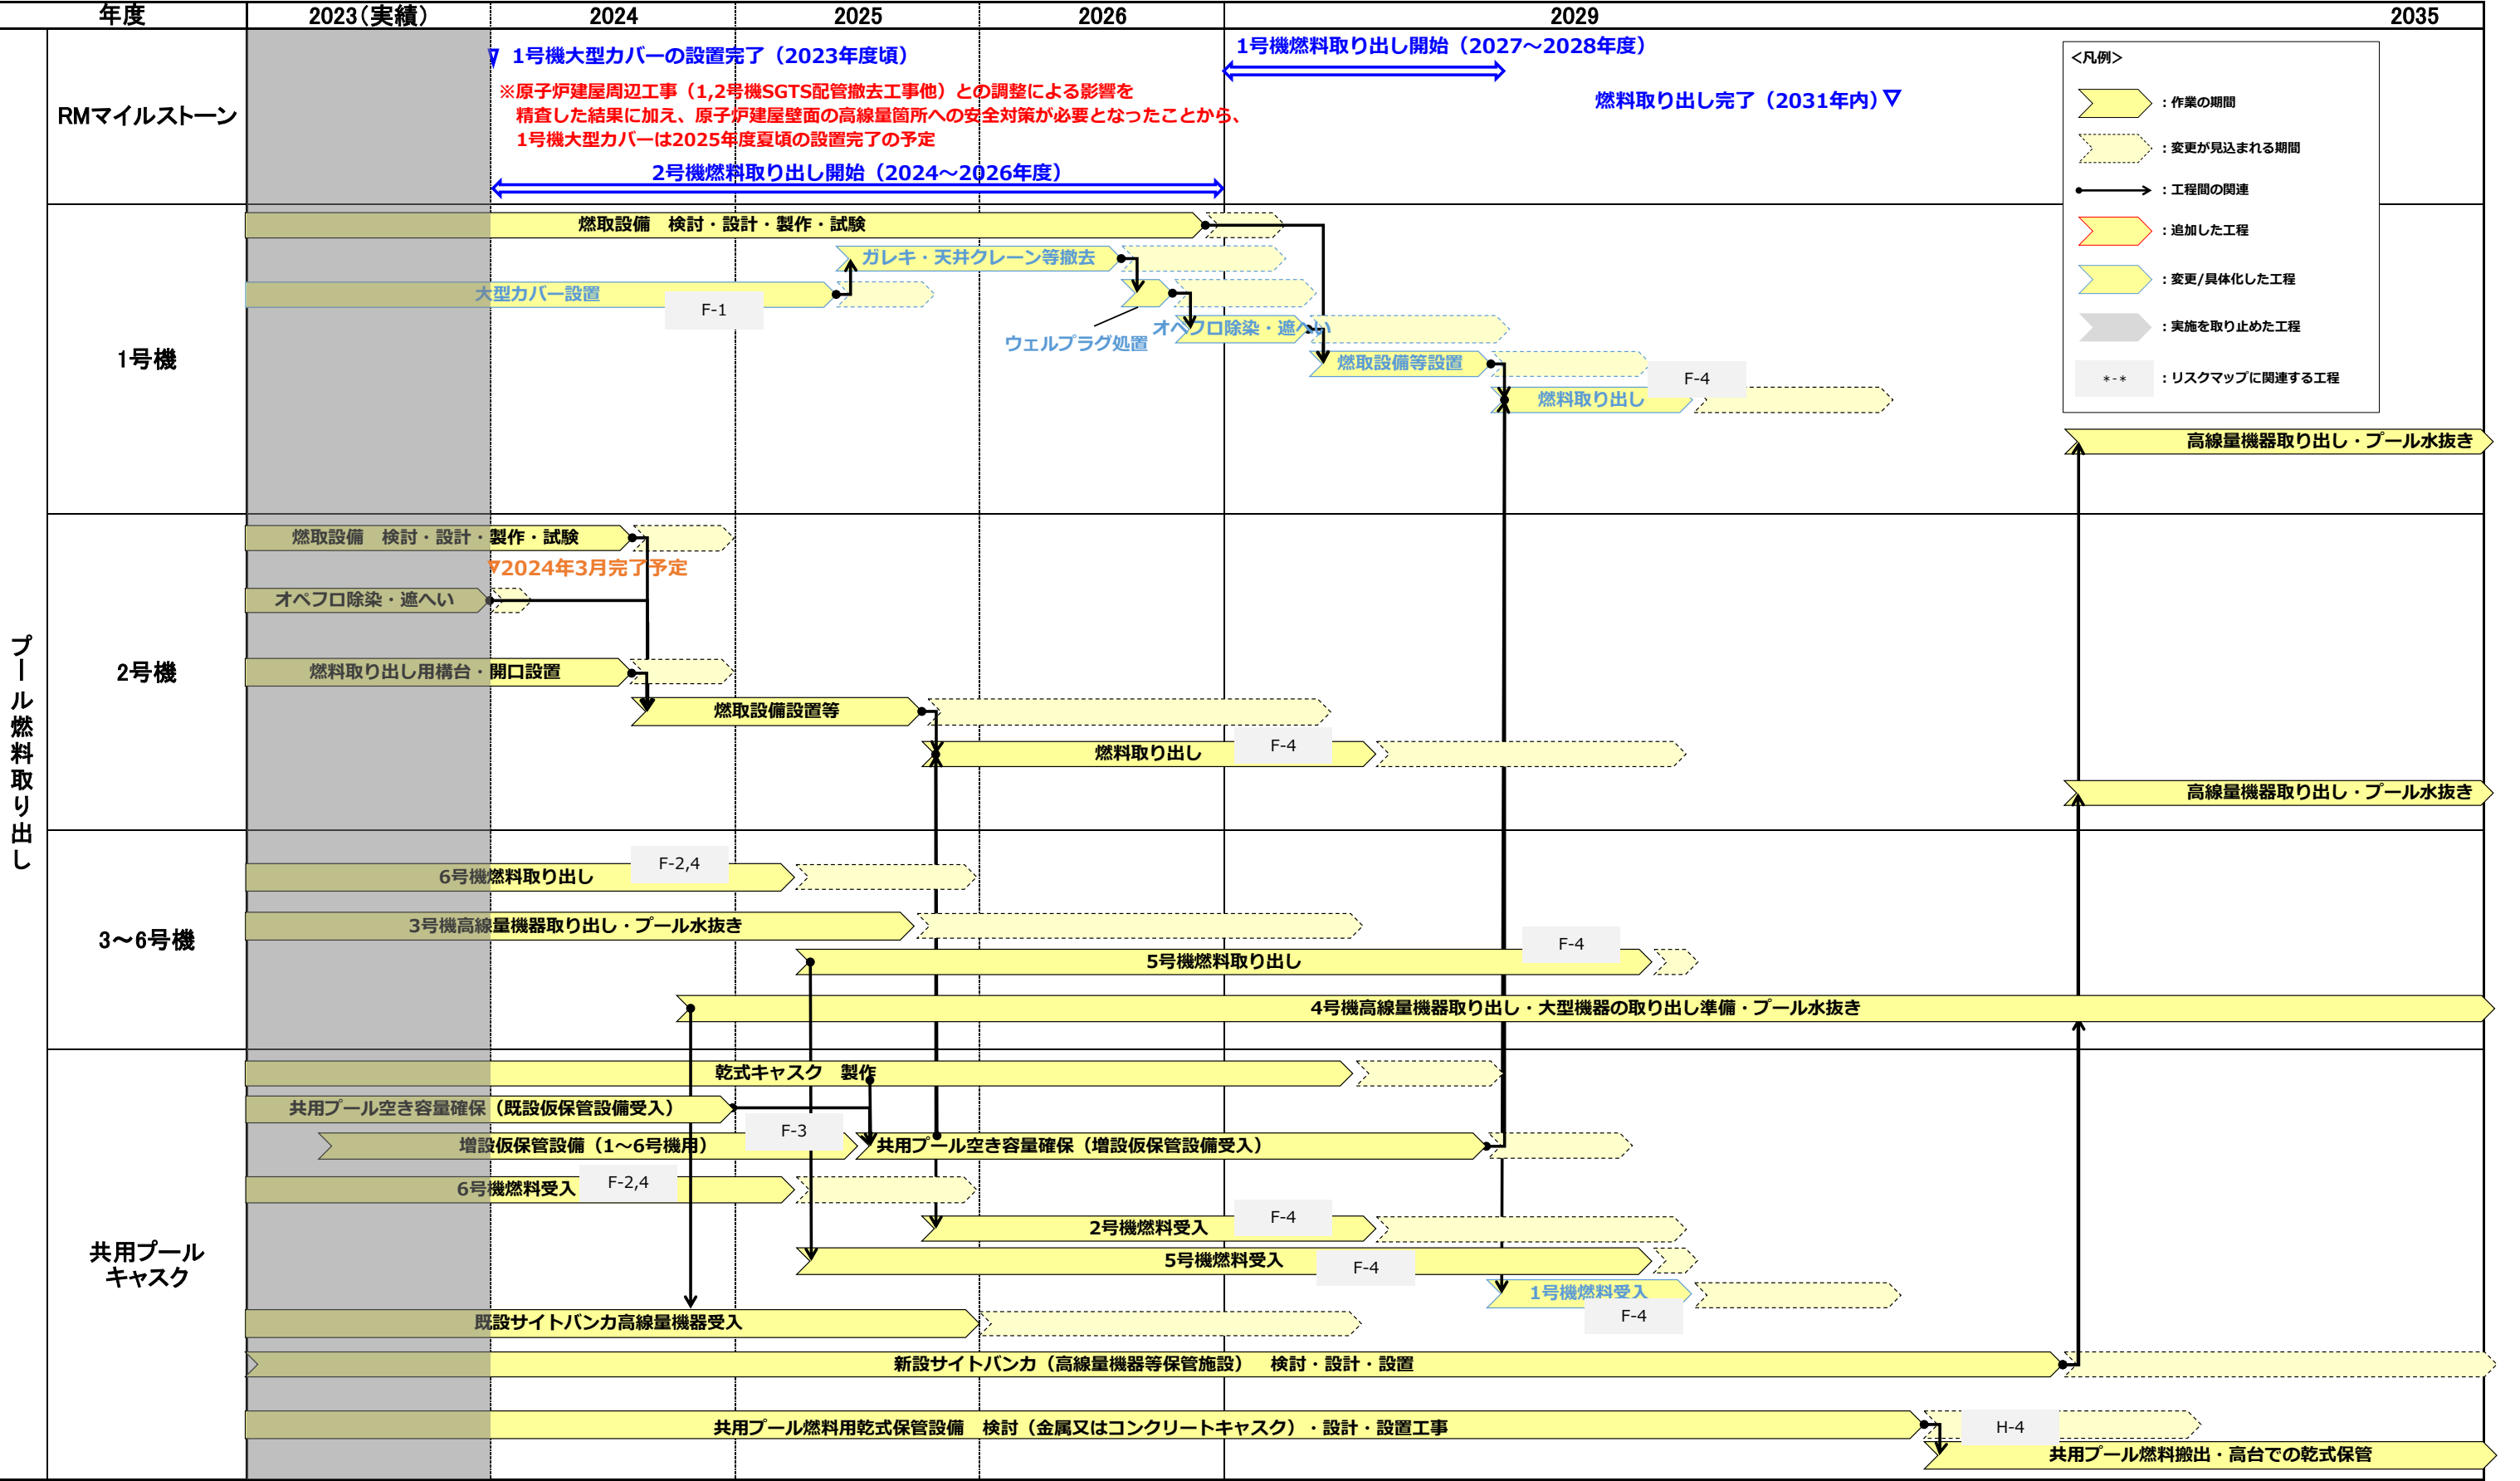

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
