


汚染水対策スケジュール（1/3）

分野 色	活 り	対象設備・ 作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	3月					4月					5月			6月			7月			8月			9月			10月以降	備 考												
				2	9	16	23	30	6	13	20	27	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下															
汚 染 水 対 策 分 野	●建屋滞留水の処理	建屋内滞留水	【1～4号機 滞留水移送装置】 （実績） ・1～4号機滞留水移送装置運転 （予定） ・1～4号機滞留水移送装置運転	現場作業	1～4号機滞留水移送装置設置 運転																			（継続運転）									プロセス主建屋・高温焼却炉建屋滞留水移送装置の設置に係る実施計画変更（2025年2月12日申請）									
			【α核種除去設備検討】	設計・工事																				（2027年度工事完了予定）									α核種除去設備の設置に係る実施計画変更（2024年6月27日申請）									
			【1～4号機 T/B床面スラッジ等の回収方法検討】	設計・検討	（2024年度回収方針策定完了）																			設計検討									（2026年度工事完了予定）									
			【滞留水一時貯留設備設計】	設計・工事																				詳細設計・工事									（2026年度工事完了予定）									建屋滞留水一時貯留設備の設置に係る実施計画変更（2025年1月21日認可）
			【プロセス主建屋・高温焼却建屋ゼオライト土壌の検討】	容器封入集積作業																				容器封入作業 詳細設計・工事									（2026年度容器封入作業着手予定）									容器封入作業 実規模モックアップ（2023年9月～） 容器封入作業 実施計画変更（2023年3月31日申請）
	●汚染水発生量を 50～70m3/日程度に 抑制(2028年度末)	浄化設備	【既設多核種除去設備】 【高性能多核種除去設備】 【増設多核種除去設備】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業	処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)																			（継続運転）									処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転 または処理停止 増設多核種除去設備 前処理設備改造に係る実施計画変更申請（2022年4月28日認可） 使用前検査終了証受領 2024年5月31日 濃縮液の試験的先行処理実施中 前処理設備改造後のHOT試験を実施中									
			【サブドレン浄化設備】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業	処理運転																			（継続運転）																		
			【地下水バイパス設備】 （実績） ・運転 （予定） ・運転	現場作業	運転																			（継続運転）									排水井B点検停止（2025年6月復旧予定） 3月下旬よりスクリーン製作開始(製作期間が計画より1ヶ月程度要する)									
			【セシウム吸着装置】 【第二セシウム吸着装置】 【第三セシウム吸着装置】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業	処理運転																			（継続運転）																		
			【RO-3】 【建屋内RO 循環設備】 （実績） ・運転 （予定） ・運転	現場作業	運転																			（継続運転）																		
		陸側遮水壁	（実績） ・維持管理運転 （予定） ・維持管理運転	現場作業	維持管理運転																			（継続運転）																		
		フェーシング（陸側遮水壁内エリア）	【凍土壁内フェーシング（全6万㎡）】 ・2号機建屋西側	現場作業	2号機建屋																																					
		1～4号機建屋周辺トレンチ調査	（実績・予定） →10箇所の調査実施（2024年度） ・5箇所の調査実施（2025年度）	現場作業																													2024年4月24日調査開始 2024年12月19日調査完了（1箇所は、対象トレンチが発見できなかったため、2025年度に再調査予定） 2025年5月調査開始予定（2025年度）									
		建屋間ギャップ端部止水対策	（実績・予定） ・3号機：6箇所(2025年度) ・	現場作業																													【3号機】 2026年3月：完了予定	2024年7月16日準備工事開始 （2025年度：6箇所/6箇所完了予定）								

2/3

廃炉中長期実行プラン2025

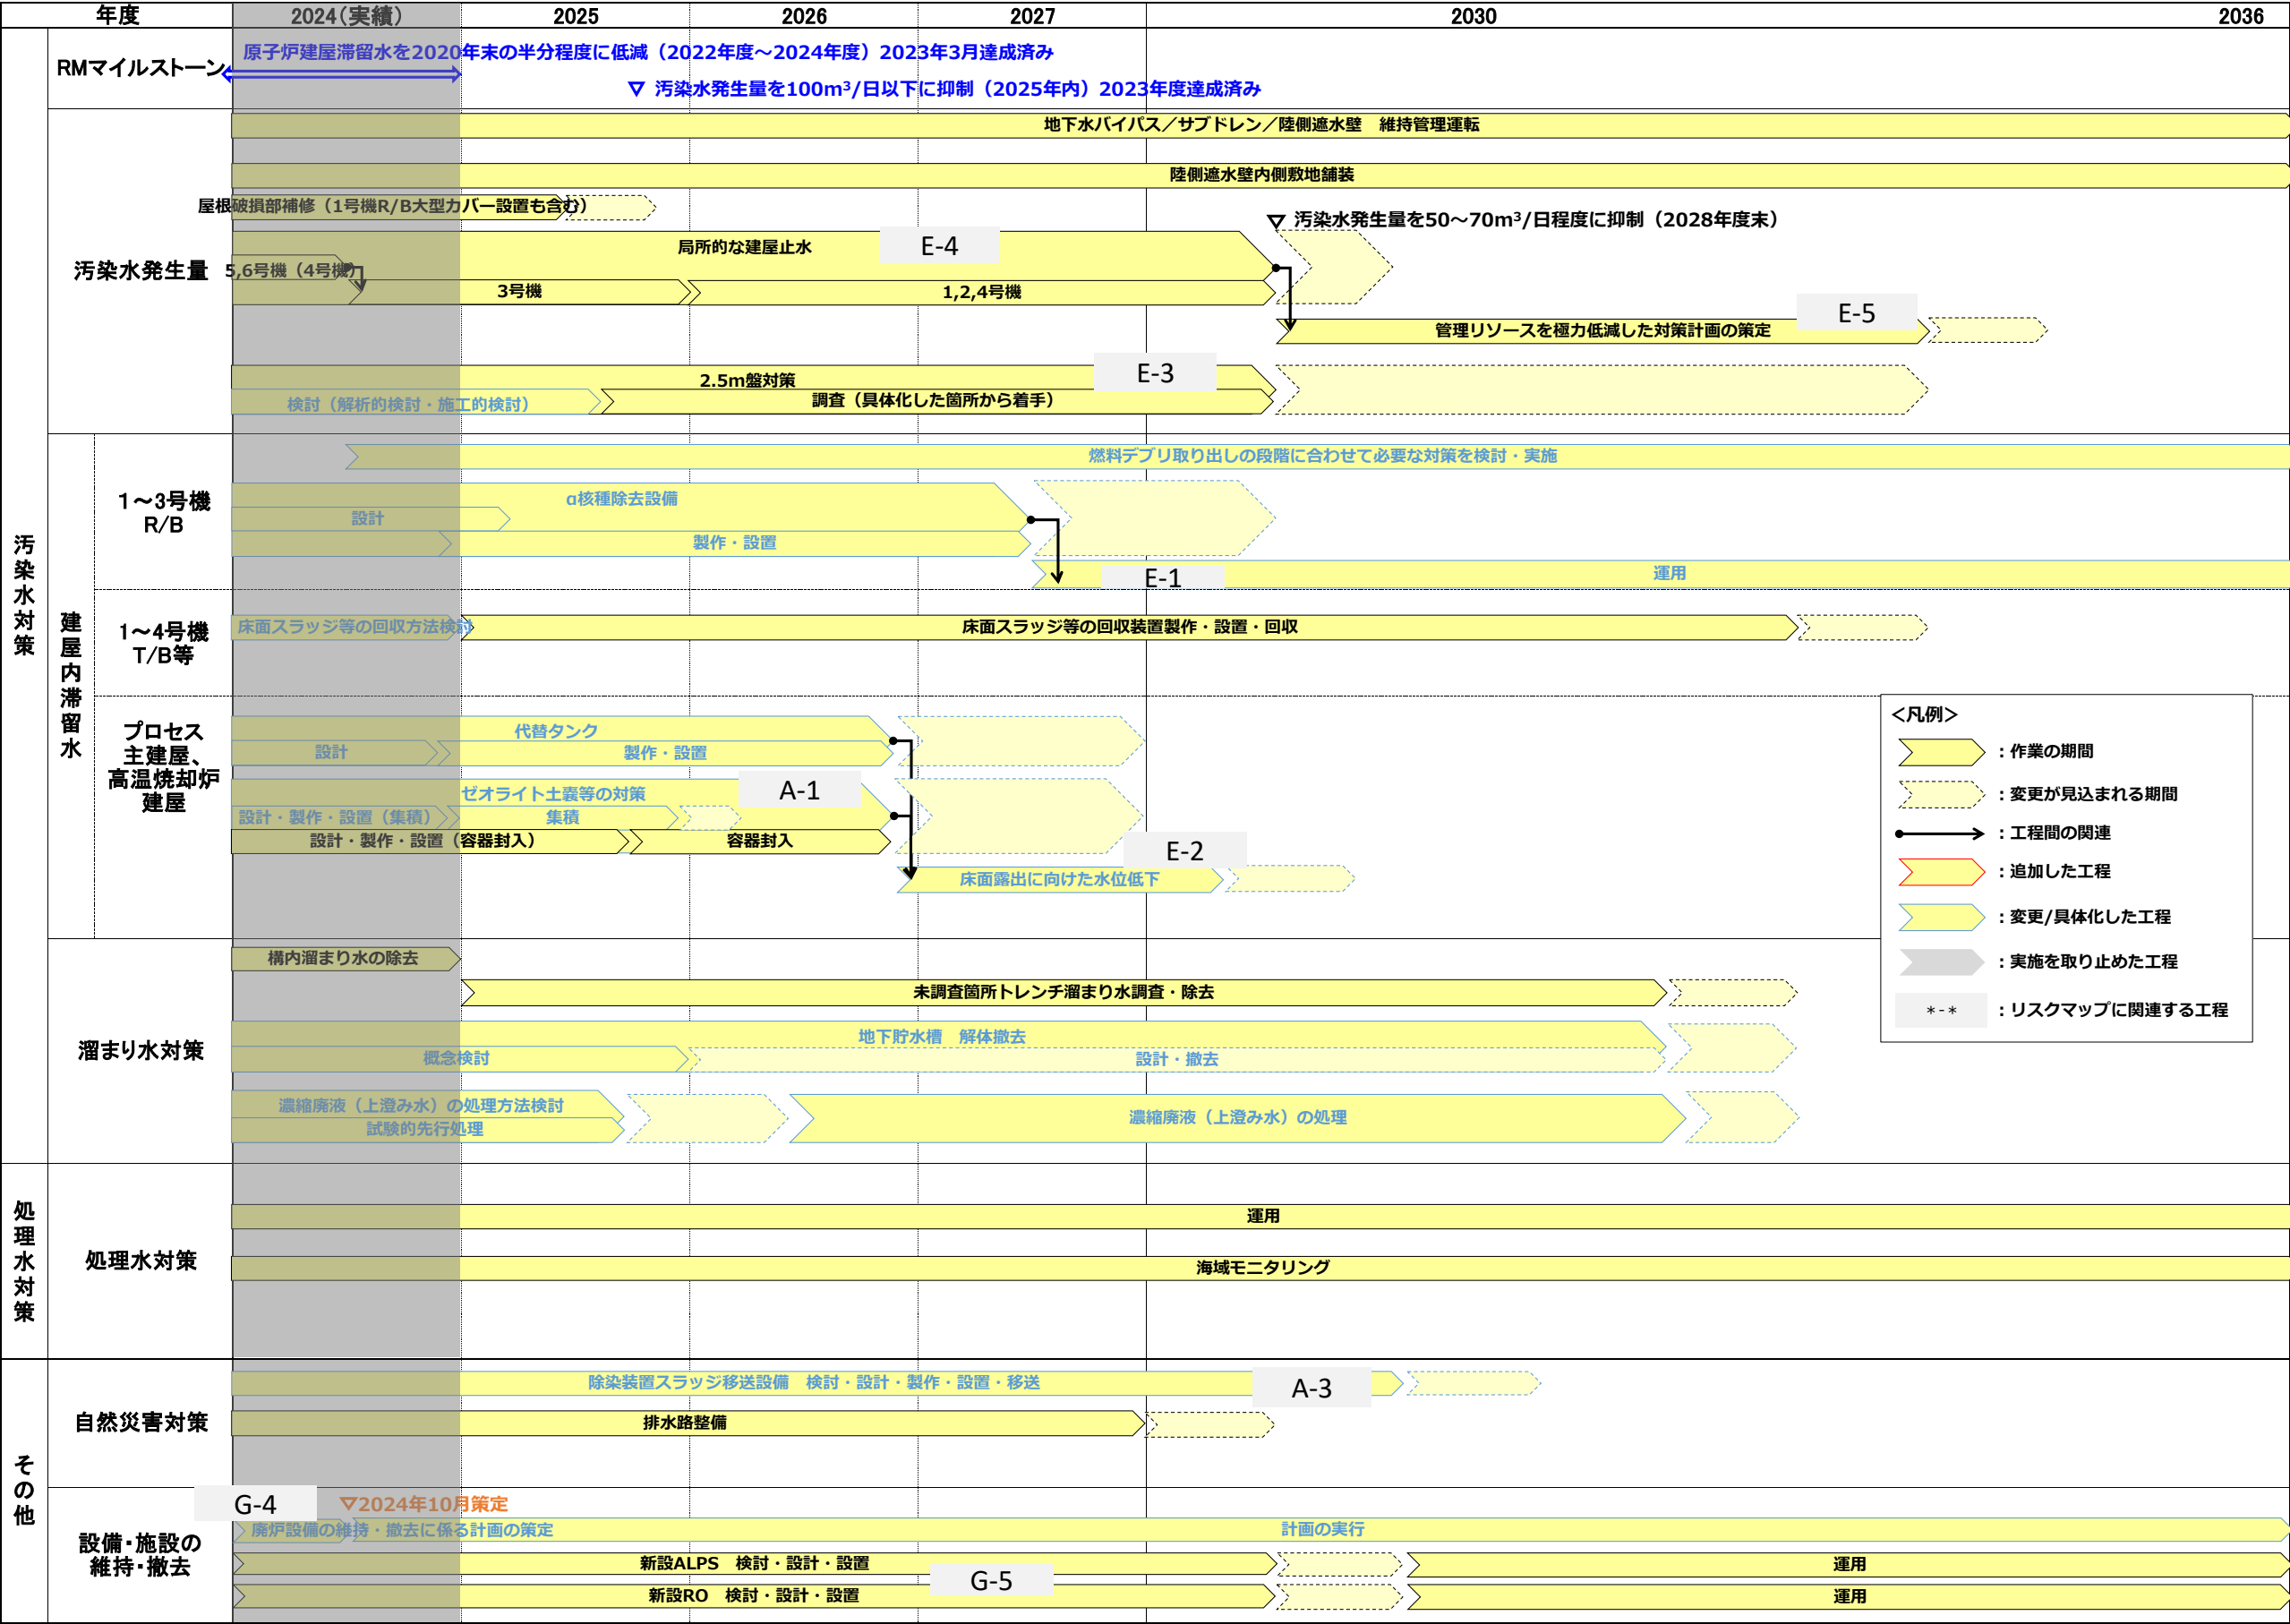

<凡例>

- 作業の期間
- 変更が見込まれる期間
- 工程間の関連
- 追加した工程
- 変更/具体化した工程
- 実施を取り止めた工程
- *-* : リスクマップに関連する工程

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
