

# 2号機燃料取り出しに向けた工事の進捗について

2025年4月24日

**TEPCO**

---

東京電力ホールディングス株式会社

# 1. 燃料取り出し計画及び進捗について

- 2026年度までに開始する燃料取り出し作業に向け作業を実施中。
- 燃料取り出し用構台，原子炉建屋オペレーティングフロア南側に開口，ランウェイガーダの設置が完了し，今後燃料取扱設備を設置する計画。

## 【構内】

- 燃料取扱設備設置に向け，付帯設備設置作業を継続実施。
- 使用済燃料プール浄化装置設置作業が完了。(片付け作業を継続実施)

## 【構外】

- 2025年5月上旬，汚染拡大防止ハウス※の地組に着手予定。

※燃料取扱設備を原子炉建屋に進入させる際に展張する蛇腹形状のハウス

## 【工場】


- 燃料取扱設備の最終試験が完了し，海上輸送に向けた梱包を実施中。



## 2. 燃料取扱設備の製作状況

- 2025年4月8日に燃料取扱設備の工場出荷前最終試験が完了。
- 2025年5月下旬※の燃料取扱設備工場出荷に向け、海上輸送に備えた梱包を実施中。
- 燃料取扱設備を海上輸送にて1F港湾に搬入し、1F港湾からスーパーキャリアで2号機燃料取り出し用構台近傍に運搬。その後、燃料取り出し用構台にクレーンで吊り込む計画。

※気象条件（波・風）により日程変更の可能性有

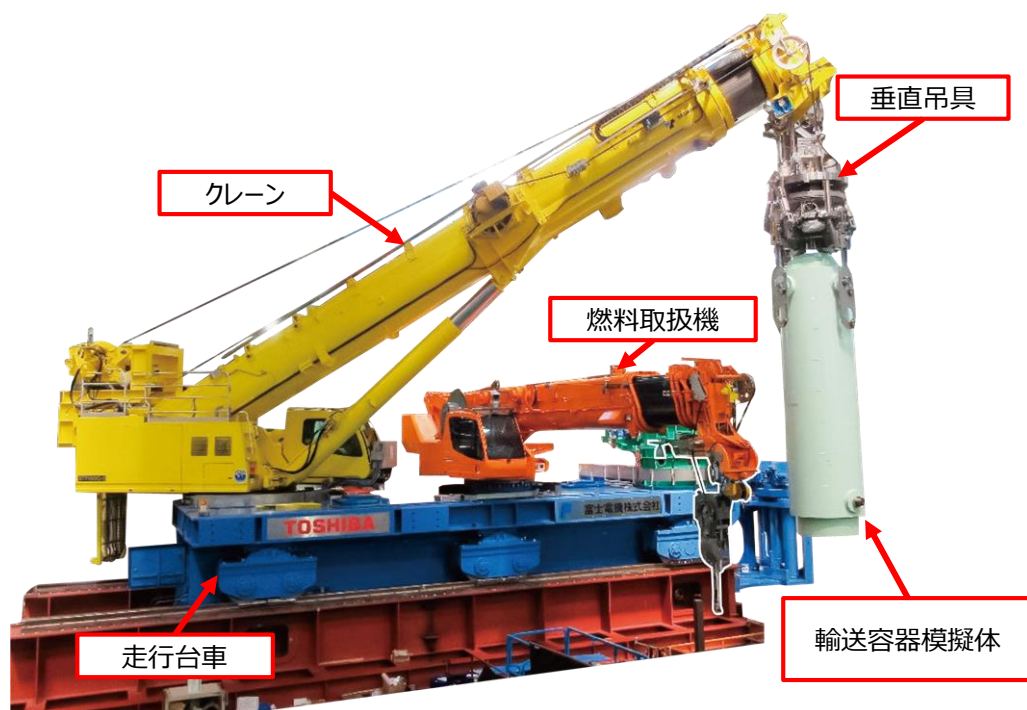

燃料取扱設備




### 3. 使用済燃料プール浄化装置設置工事


- 2025年4月14日から使用済燃料プール浄化装置の設置作業を開始。
- 4月18日に設置作業が完了し，4月21日に試運転を行い使用可能であることを確認。



浄化装置設置箇所

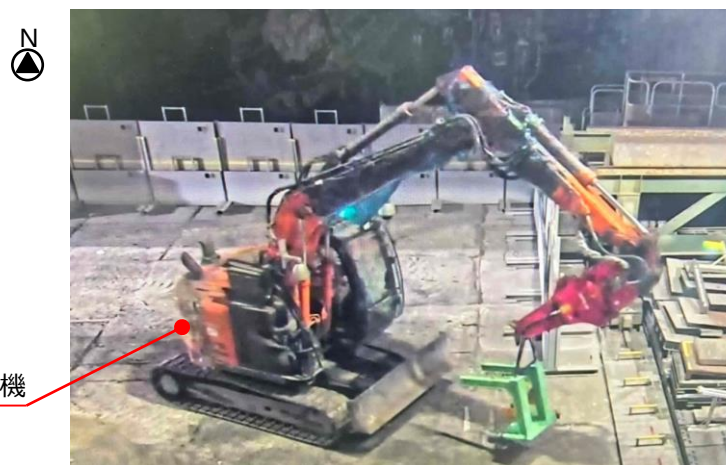


浄化装置設置状況（撮影2025.4.15）

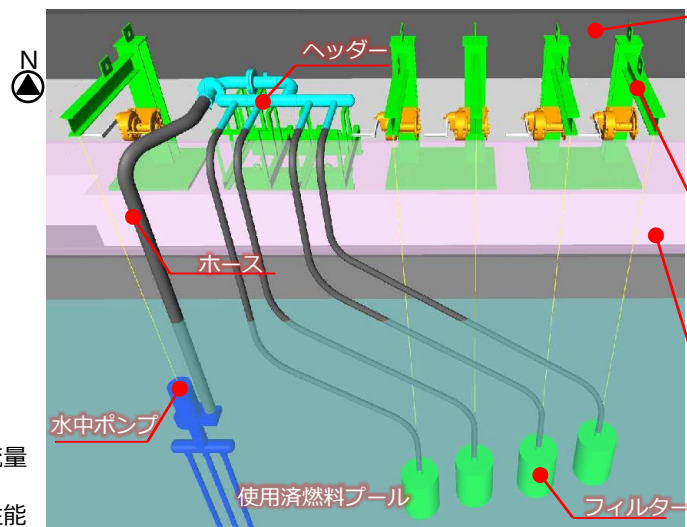

側から見た浄化装置イメージ

- Box遮蔽
- フィルタ交換治具
- 設置治具
- 異物混入防止フェンス

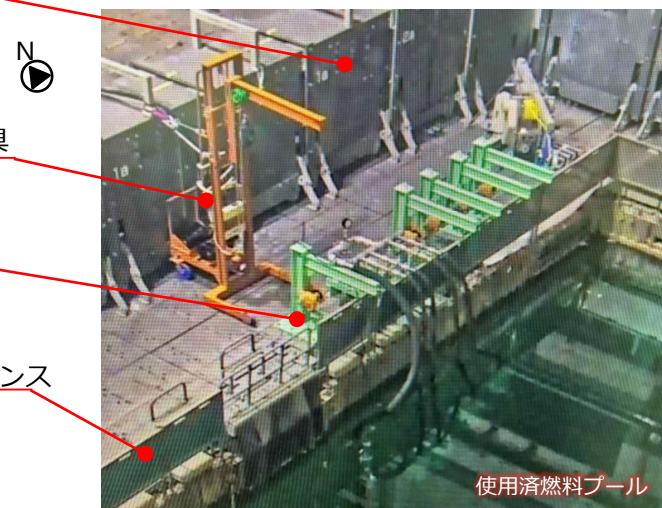


浄化装置設置状況（撮影2025.4.22）

装置仕様  
水中ポンプ流量  
45m<sup>3</sup>/h  
フィルター性能  
3～5μm

## 4. 今後のスケジュール

- 2026年度までに開始する燃料取り出し作業に向けて、現時点で順調に進捗。
- 安全最優先に作業を進めてまいります。

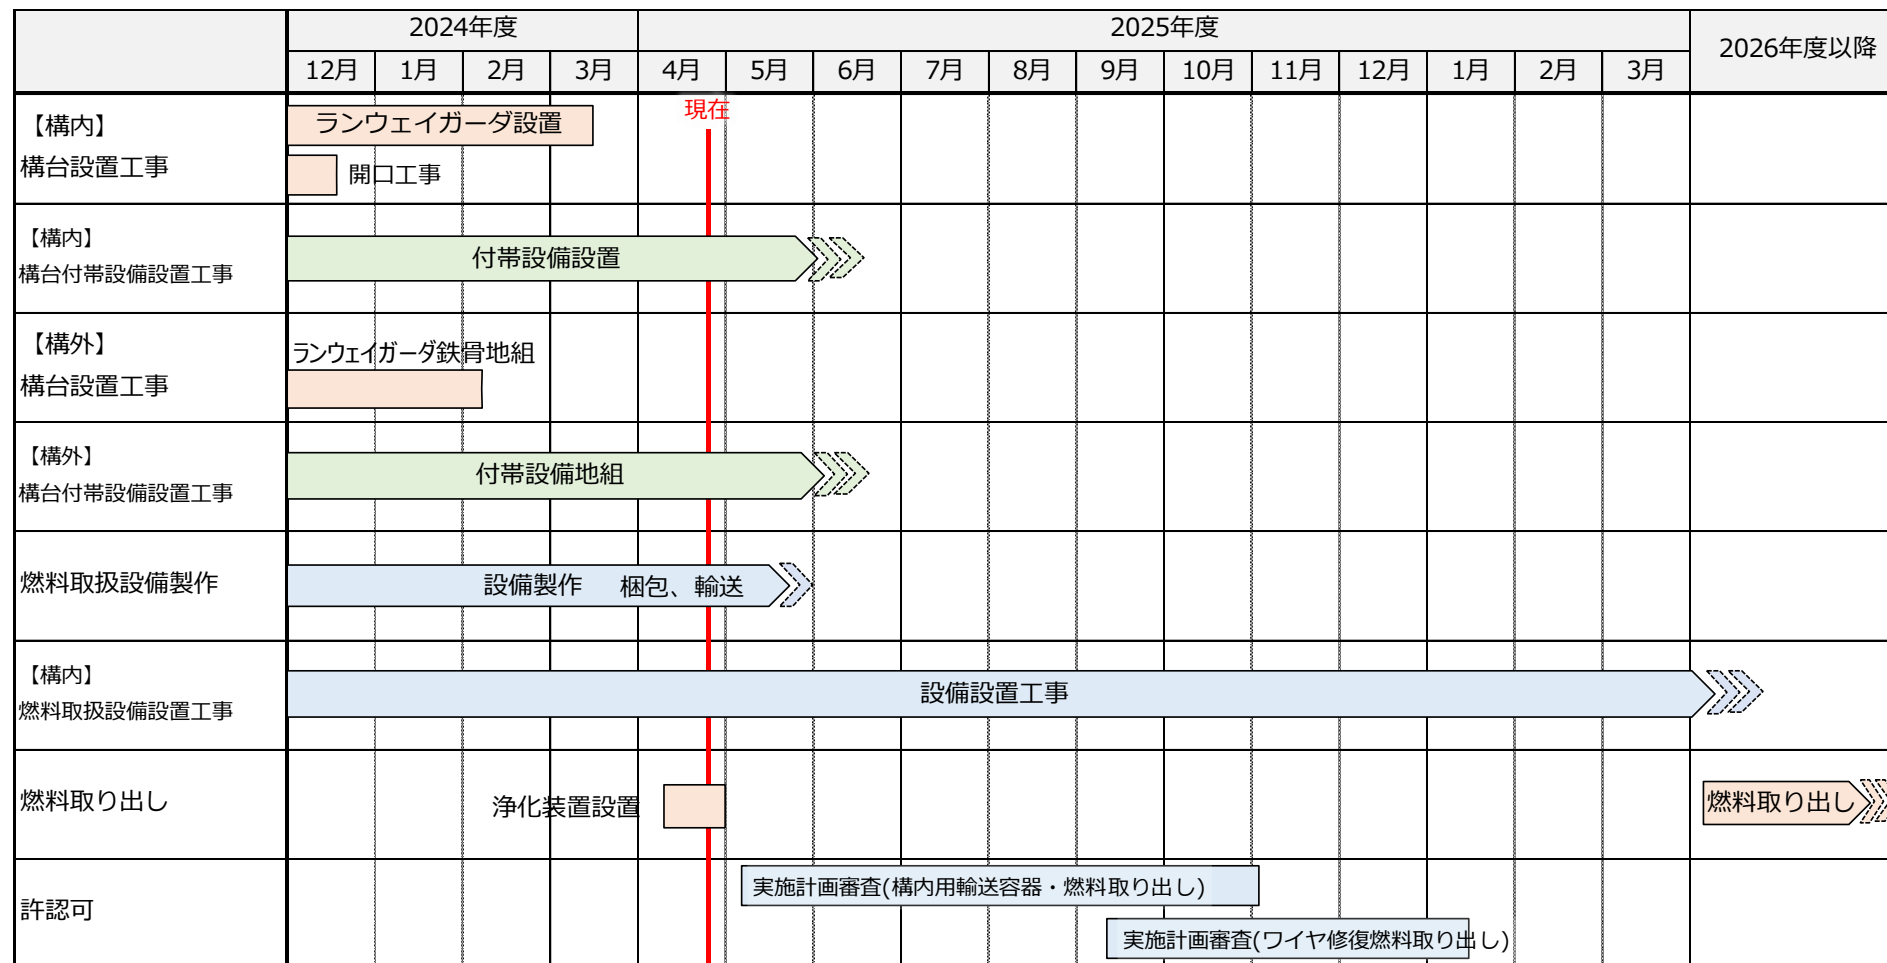

※工程の進捗により変更する可能性有

※線表については、準備・片付け作業期間含む
