


使用済燃料プール対策 スケジュール

東京電力ホールディングス株式会社
使用済燃料プール対策
2026/1/29現在

分野名	施工中長期実行プラン2025 目標工程	活 り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	12月	1月					2月					3月			4月			5月			6月			備 考							
					28	4	11	18	25	1	8	15	22	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下									
使用 済 燃 料 プ ール 対 策	●1号機大型カバーの設置完了(2023年度頃) ●1号機燃料取り出しの開始(2027~2028年度) ●2号機燃料取り出しの開始(2024~2026年度) ●1~6号機燃料取り出し完了(2031年内) ●5号機使用済燃料取り出し ●6号機新燃料の搬出 ●その他プール燃料取り出し関連作業	力 バ ー	1号機	<p>(実績) ・大型カバー、ガレキ撤去の検討・設計 ・現地調査等 ・作業ヤード整備 ・本体鉄骨(可動屋根)設置 ・ガレキ撤去用天井クレーン設置 ・【構内】大型カバー換気設備他設置工事</p> <p>(予定) ・大型カバー、ガレキ撤去の検討・設計 ・現地調査等 ・作業ヤード整備 ・ガレキ撤去用天井クレーン設置 ・【構内】大型カバー換気設備他設置工事 ・ガレキ撤去用天井クレーン設置 ・ガレキ撤去</p>	<p>検討・設計</p> <p>①現地調査等 ('13/7/25~)</p> <p>②作業ヤード整備、構外ヤード地組等</p> <p>③本体鉄骨達成、ガレキ撤去用天井クレーン設置等</p> <p>④【構内】大型カバー換気設備他設置工事</p>	<p>大型カバー、ガレキ撤去の検討・設計</p> <p>①現地調査等 ('13/7/25~)</p> <p>②作業ヤード整備、構外ヤード地組等</p> <p>③本体鉄骨達成、ガレキ撤去用天井クレーン設置等</p> <p>④【構内】大型カバー換気設備他設置工事</p>	<p>(2026年度完了予定)</p> <p>(2026年度完了予定)</p> <p>(2026年度完了予定)</p> <p>(2026年度完了予定)</p> <p>ガレキ撤去</p>	<p>【主要工程】 ○ガレキ撤去 ・ガレキ撤去 : '18/1/22~20/11/24 (大型カバー設置後に再開予定) ・SFP内仮設物等調査 : '19/7/17~'19/8/26 ・SFPゲートカバー設置 : '20/3/16~'20/3/18 ・SFP養生設置 (準備作業含む) : '20/3/20~'20/6/18 ・FIM支保設置 (準備作業含む) : '20/9/15~'20/10/23 ・天井クレーン支保設置 (準備作業含む) : '20/10/28~'20/11/24</p> <p>○大型カバー設置 ・大型カバー仮設構台等設置 : '21/8/28~'24/4/11 ・本体鉄骨(下部架構)設置 : '23/6/19~'24/11/4 ・本体鉄骨(上部架構)設置 : '24/11/15~'25/8/28 ・本体鉄骨(ボックスリング)設置 : '25/5/21~'25/10/12 ・本体鉄骨(可動屋根)設置 : '25/11/7~'26/1/19 ・ガレキ撤去用天井クレーン設置 : '26/1/20~ ・大型カバー換気設備他設置工事 : '24/12/16~ ・外周鉄骨撤去 : '24/10/29~'25/9/5</p> <p>【規制庁関連】 ・オペレーティングフロア床上ガレキの一部撤去等 実施計画変更認可 ('19/3/1) ・大型カバー 実施計画変更認可 ('23/3/23) ・大型カバー換気設備他 実施計画変更認可 ('22/10/27)</p> <p>※○番号は、別紙配置図と対応</p>																											
					<p>燃料取り出し用カバーの詳細設計の検討 原子炉建屋上部のガレキの撤去 燃料取り出し用カバーの設置工事</p>																														
					<p>燃料取り出し用カバーの設置完了(2023年度頃)</p>																														
					<p>燃料取扱設備</p> <p>クレーン／燃料取扱機の設計・製作 燃料調査等</p>	<p>1号機</p>	<p>(実績) ・燃料取り出し設備の検討・設計・製作 (予定) ・燃料取り出し設備の検討・設計・製作</p>	<p>検討・設計</p>	<p>燃料取り出し設備の検討・設計・製作</p>	<p>(2026年度完了予定)</p>	<p>【主要工程】 ・燃料取り出し設備の選択 : 2014年10月 ・プール燃料取り出しに特化したプランを選択 ・ガレキ撤去計画継続検討 【規制庁関連】 ・燃料取り出し計画の選択 : '19/12/19</p>																								
			<p>燃料取り出し</p> <p>2号機</p>																																
		<p>5号機使用済燃料取り出し</p> <p>6号機新燃料の搬出</p>	<p>5号機</p> <p>6号機</p>																																
	<p>共用 プ ール</p> <p>●その他プール燃料取り出し関連作業</p>	<p>燃料受け入れ</p> <p>乾式キャスク製作</p> <p>共用プール空き容量確保(既設仮保管設備受入)</p> <p>乾式貯蔵設備(共用プール用)検討・設計・設置工事</p>	<p>3号機</p>																																
		<p>高線量機器取り出し</p>	<p>4号</p>																																

廃炉中長期実行プラン2025

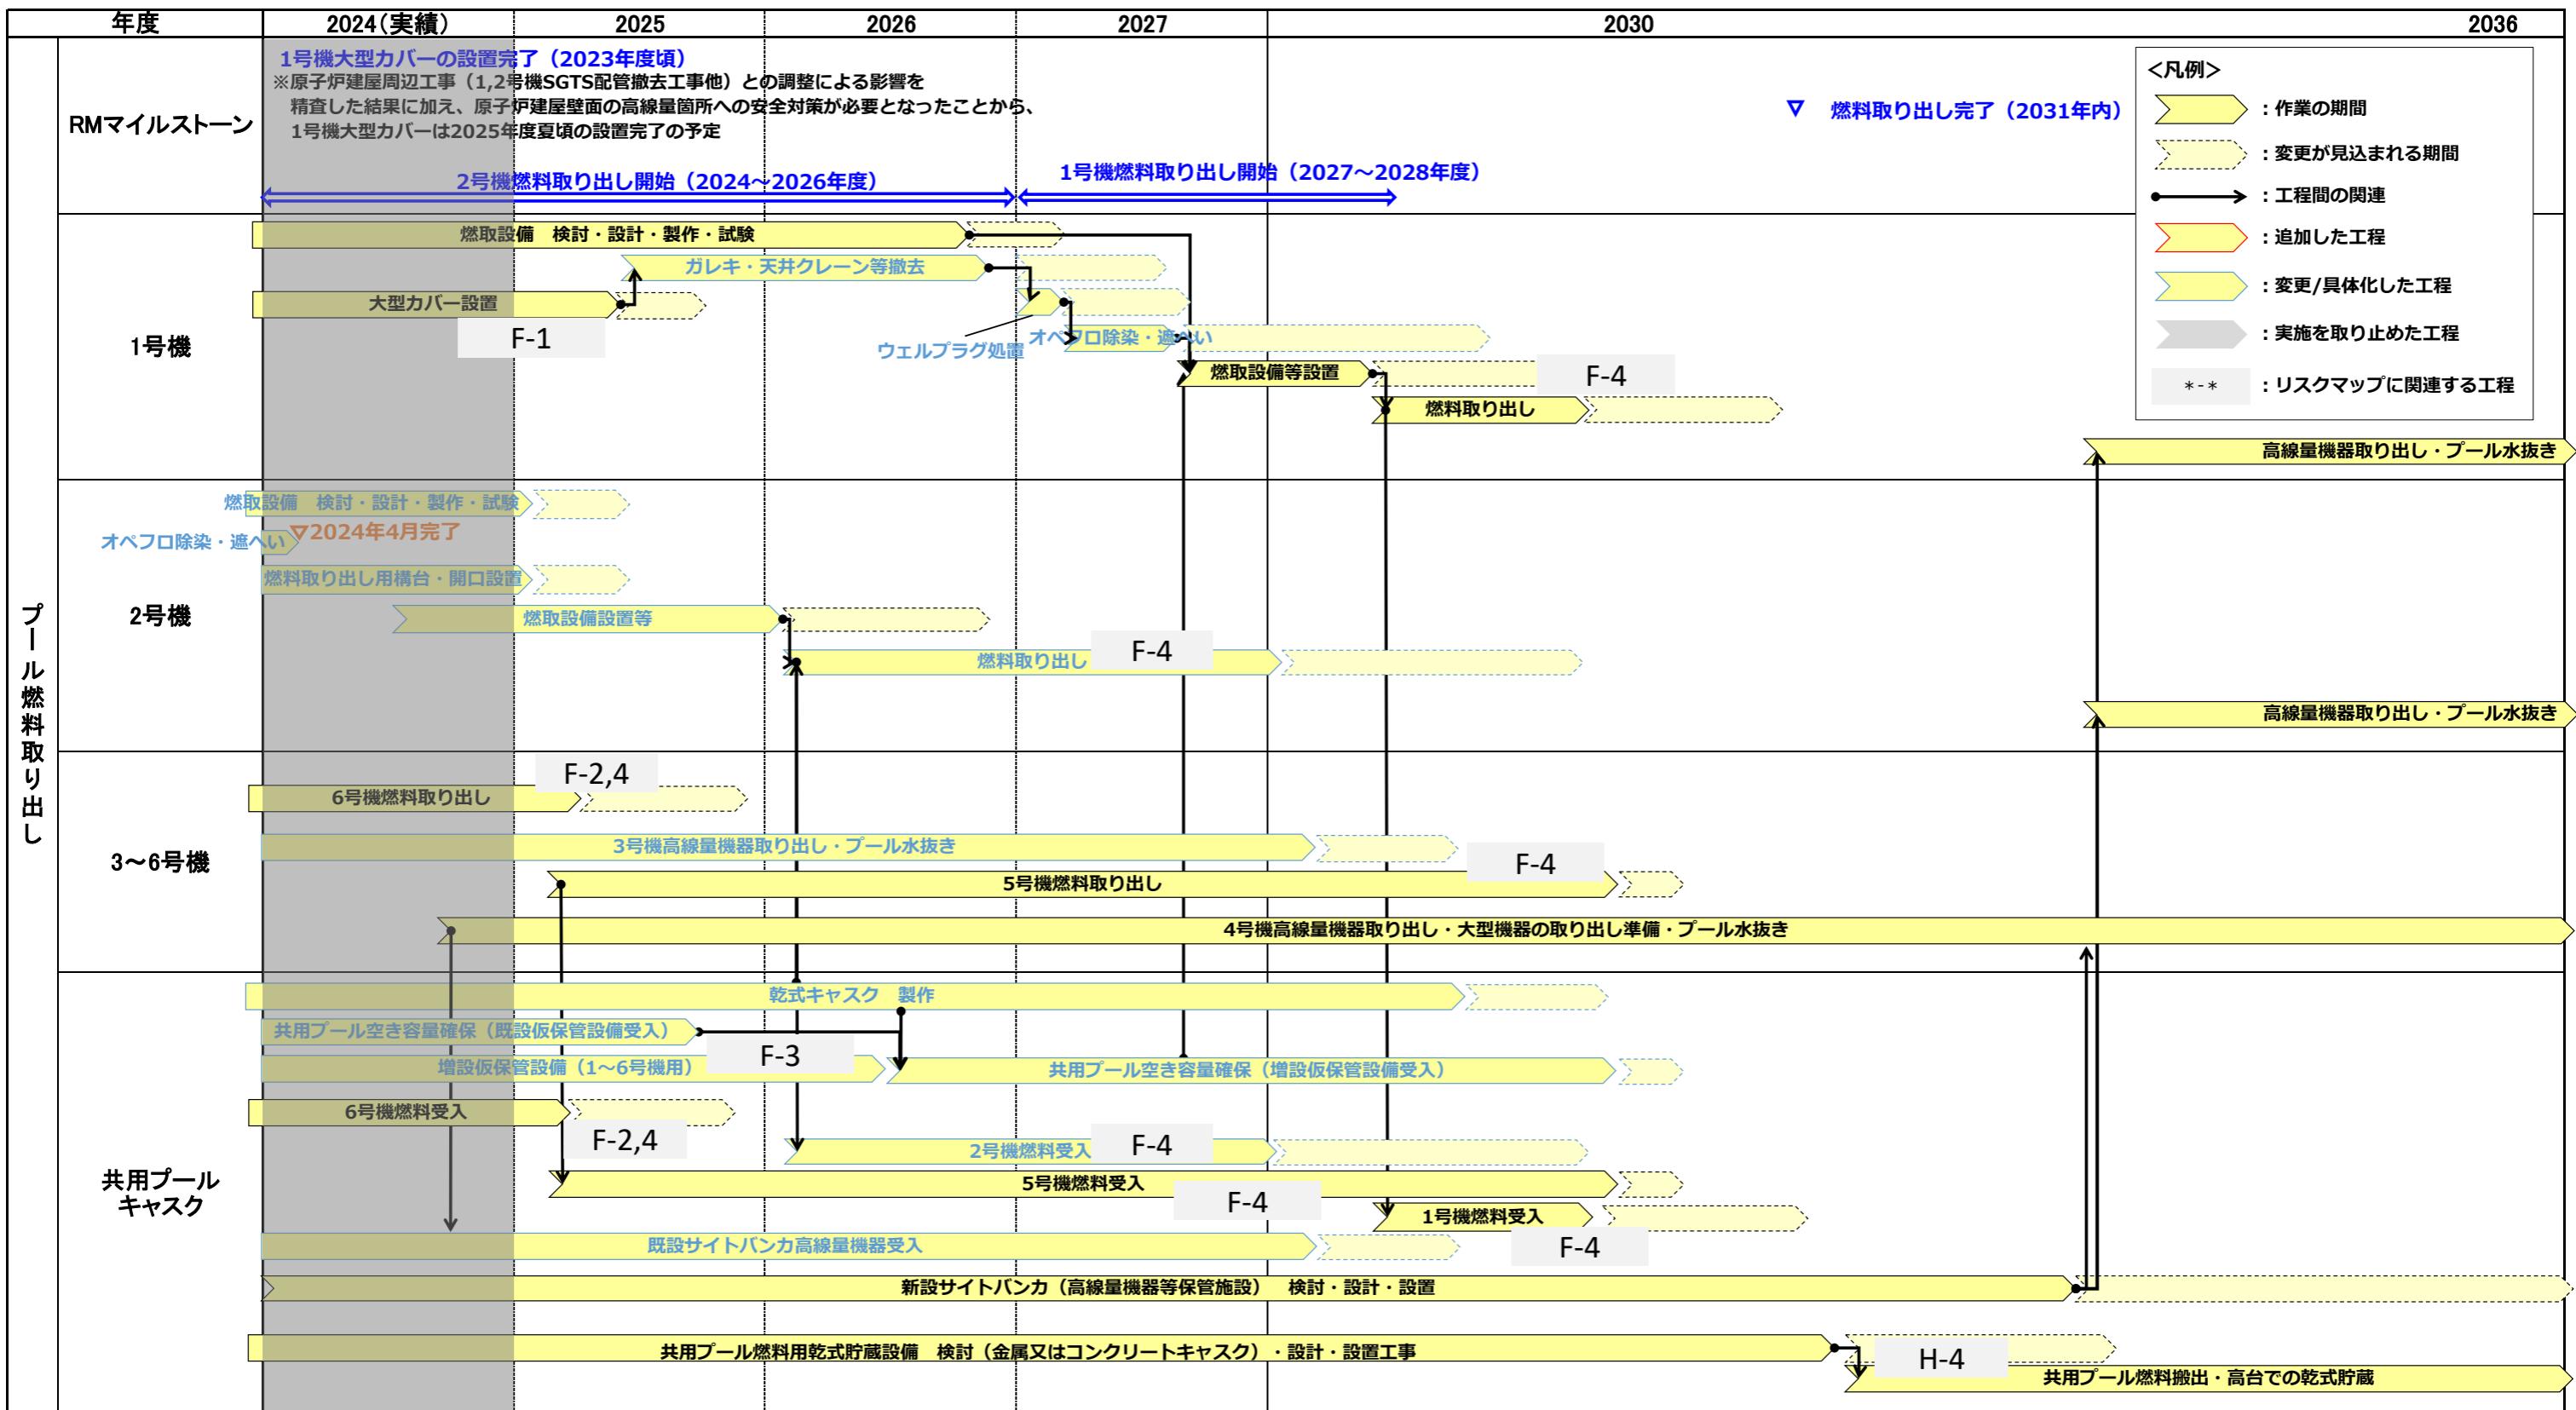

＜凡例＞

- 黄色い矢印 : 作業の期間
- オレンジ色の矢印 : 変更が見込まれる期間
- 黒い矢印 : 工程間の関連
- 赤い矢印 : 追加した工程
- 緑色の矢印 : 変更/具体化した工程
- グレーの矢印 : 実施を取り止めた工程
- *-* : リスクマップに関連する工程

注: 今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
