


1 / 3

燃料デブリ取り出し準備 スケジュール

分野名	廃炉中長期実行プラン2025 目標工程	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	12月	1月					2月			3月			4月			5月			6月			7月以降	備 考			
					28	29	30	31	1	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	1	8	15			22	29	
			3号 (実 績) (予 定) ○原子炉格納容器内部調査	現場作業																							PCV内部気中部調査(マイクロドローン調査) ・準備作業'25/10/23~ 常設監視計器取り外し ・準備作業'25/10/20~'25/10/30			
		P V / P C V 健全性維持	圧力容器 /格納容器の 健全性維持	検討・設計																										
			炉心状況把握	検討・設計																								○原子炉建屋内調査(地下階三角コーナの状況確認) '22/12/2~'23/1/11(片付け含む) ○3号機原子炉建屋内調査 '24/5/13~'24/6/14 ○1号機X-25ベネトレーション近傍の直営調査(アクセス性確認) '24/11/18~'24/11/27(準備、片付け含む)		
燃料デブリ取り出し準備	●燃料デブリの処理・処分方法の決定に向けた取り組み	取出後の燃料デブリ安定保管	燃料デブリ性状把握	検討・設計																								事業名称：燃料デブリの性状把握のための分析・推定技術の開発 期間：2025年度~2026年度		
		燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発	(実 績) ○【研究開発】燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発 粉状、スラリー・スラッジ状の燃料デブリ対応(継続) 燃料デブリ乾燥技術/システムの開発(完了) (予 定) ○【研究開発】燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発 粉状、スラリー・スラッジ状の燃料デブリ対応(継続)	検討・設計																								事業名称：燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発 期間：2025年度~2026年度		

- 凡 例
- ： 検討業務・設計業務・準備作業
 - ： 現場作業予定
 - ： 機器の運転継続のみで、現場作業（工事）がない場合
 - ➡： 記載以降も作業や検討が継続する場合は、端を矢印で記載
 - ： 工程調整中のもの

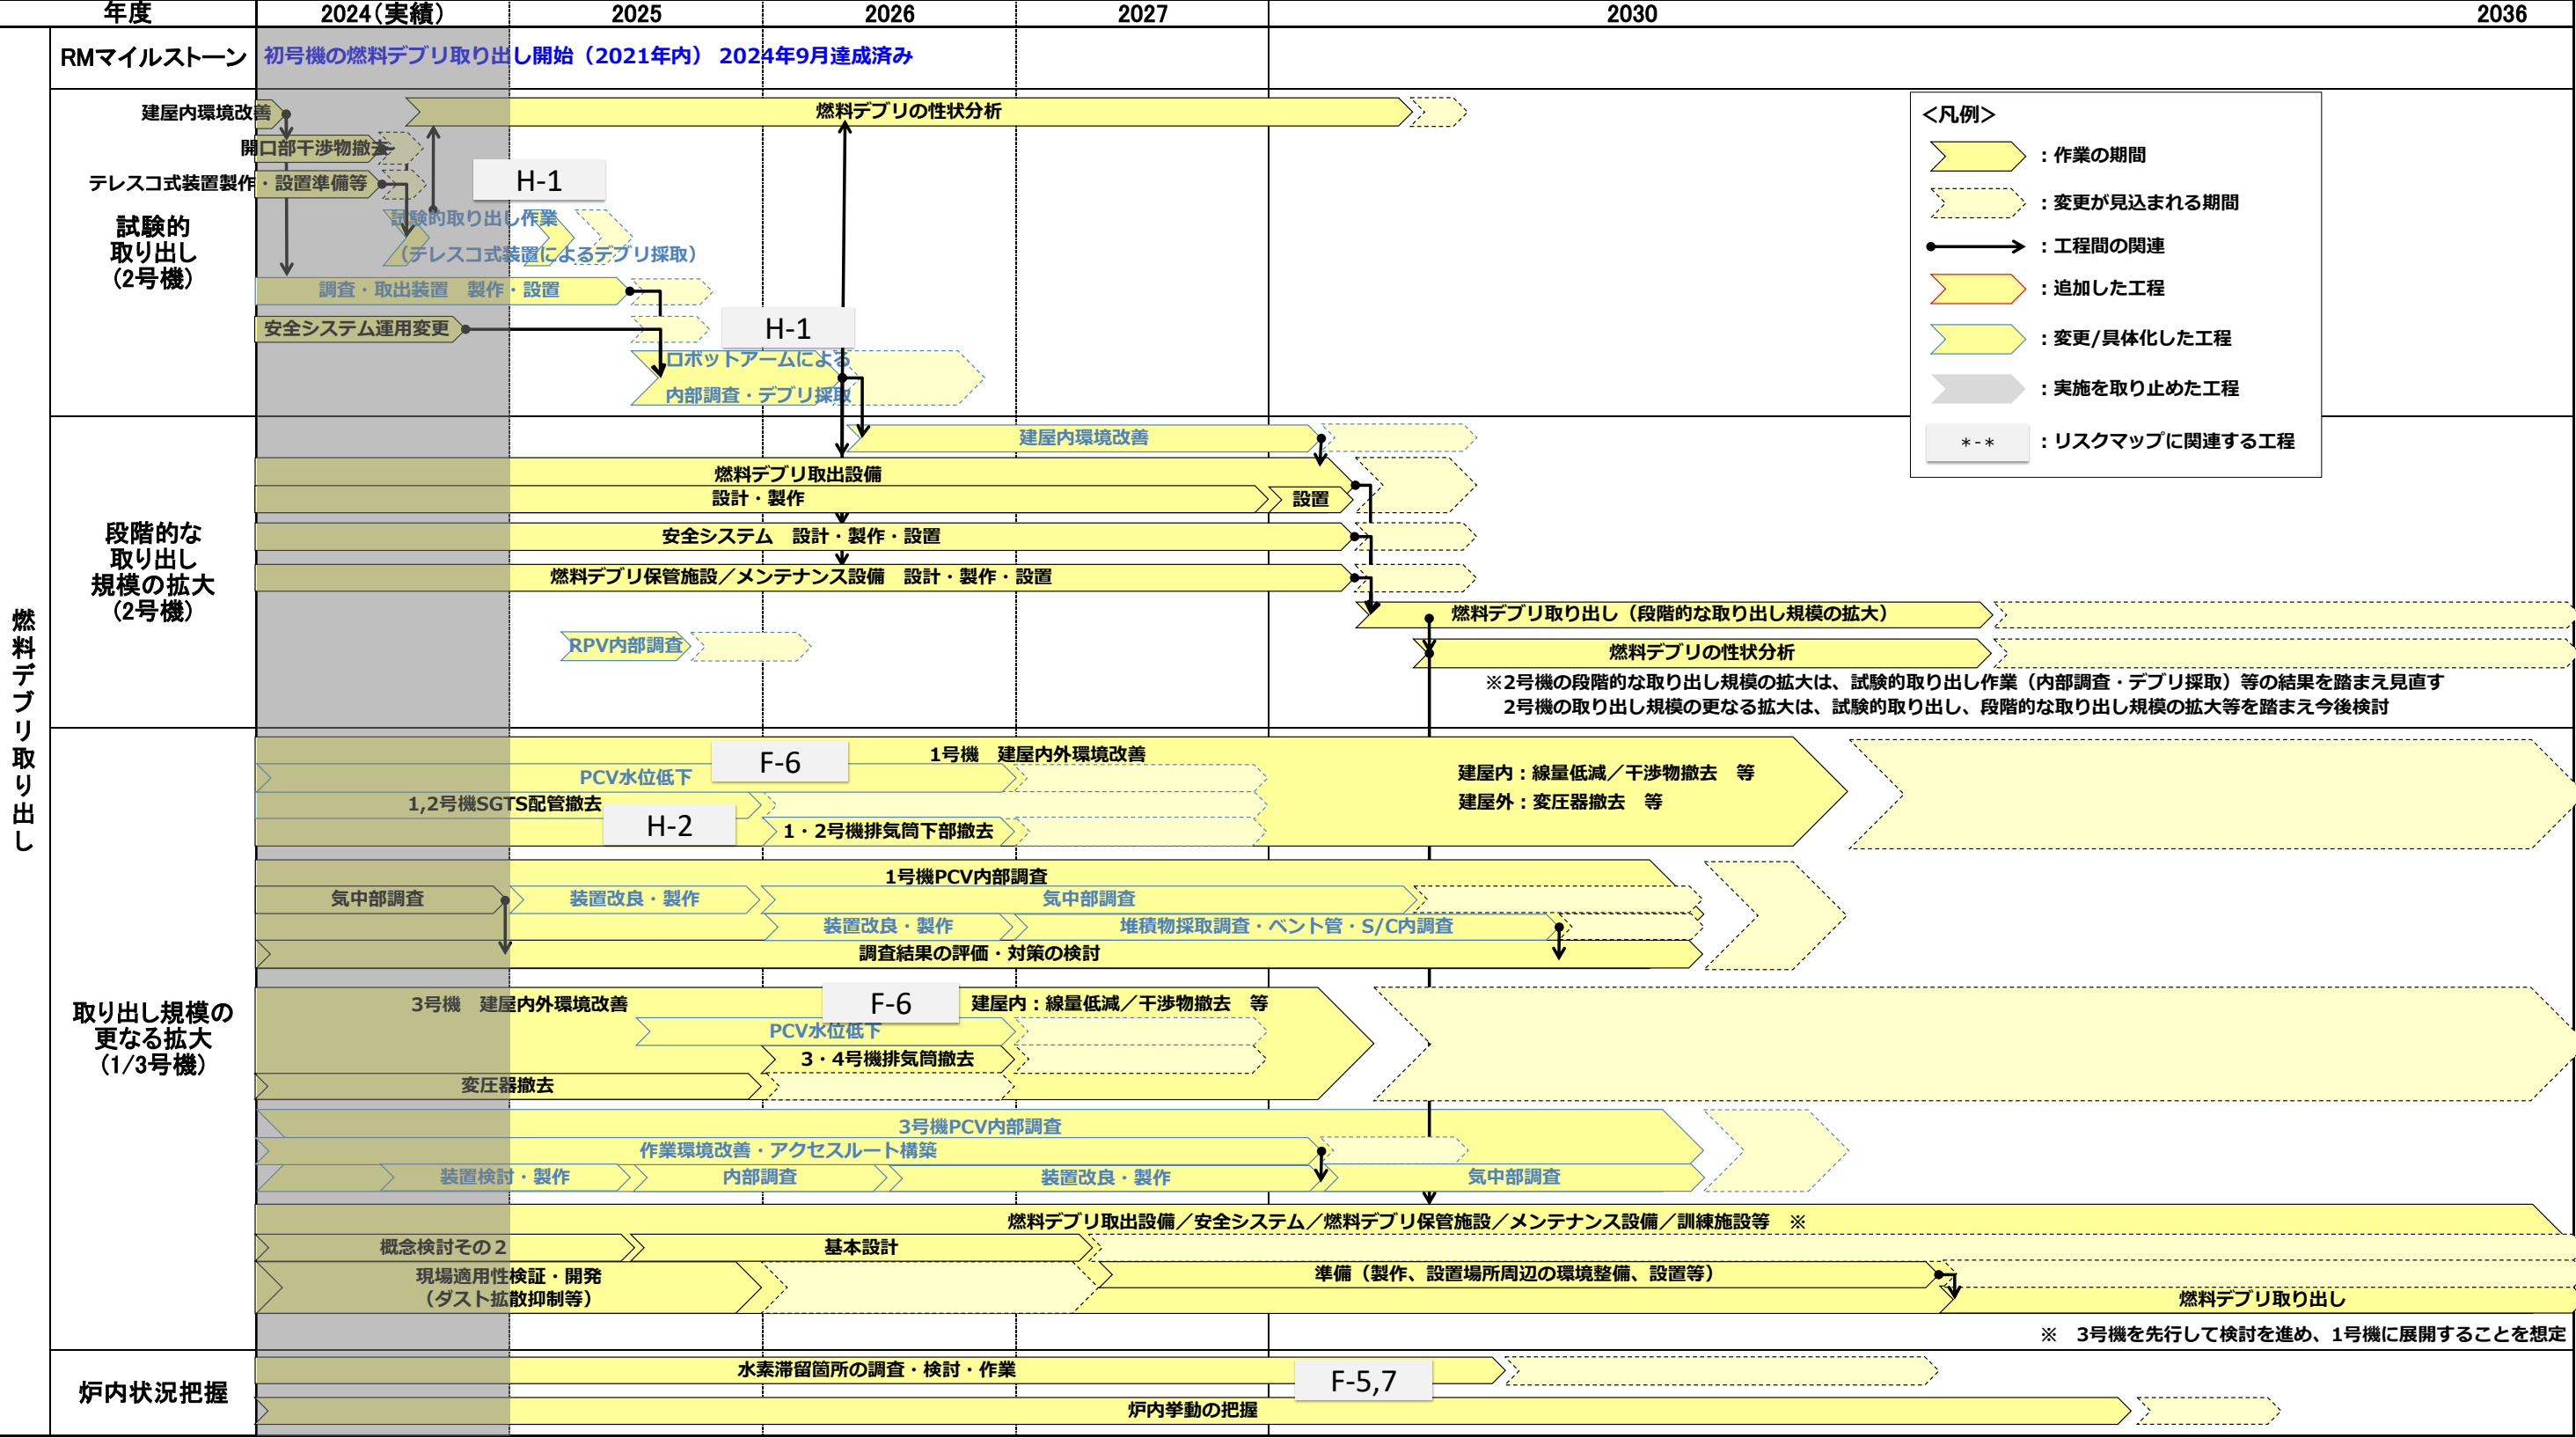

<凡例>

- 作業の期間
- 変更が見込まれる期間
- 工程間の関連
- 追加した工程
- 変更/具体化した工程
- 実施を取り止めた工程
- *** : リスクマップに関連する工程

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
