1号機飛散防止剤散布実績及び連続ダストモニタ計測値

2025年1月30日

東京電力ホールディングス株式会社

1.定期散布（1号機）

定期散布	
目　的	オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ飛散防止剤を定期的に散布し、ダストの飛散抑制効果を保持させることを目的とする。
頻　度	1回/月
標準散布量	1.5L/㎡以上
濃　度	1/10
散布範囲	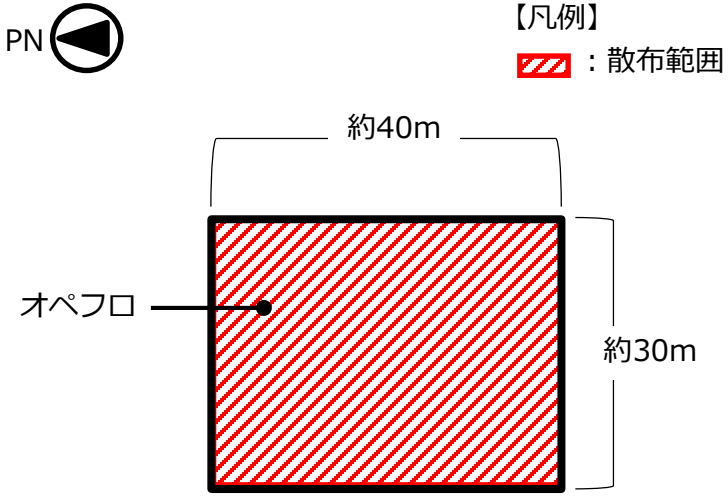
散布面積	1,234㎡

2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

TEPCO

作業時散布			
目　的	オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を散布し、ダストの飛散を抑制することを目的とする。		
標準散布量	1.5L/㎡以上	濃　度	1/10
散布対象作業	ガレキ撤去		

定期散布の実績及び予定		
計画（1月）	実績（1月）	計画（2月）
完了予定日：1月 8日	完了日：1月 9日	完了予定日：2月12 日

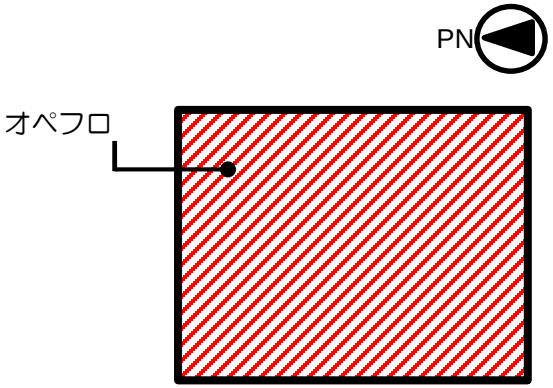

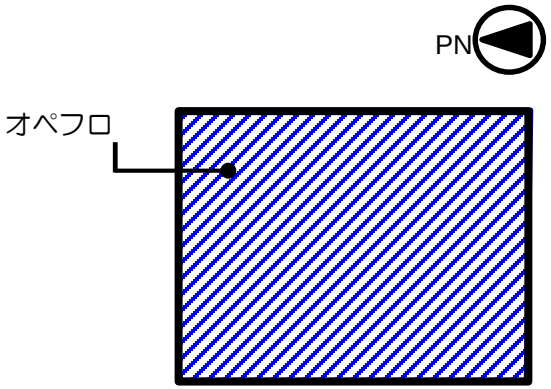

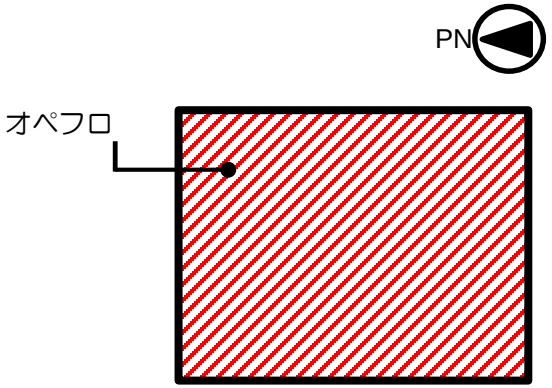

【凡例】：計画散布範囲　：実績散布範囲

2025年1月29日時点

3.作業時散布の実績及び予定（1号機）

TEPCO

	月	22（日）	23（月）	24（火）	25（水）	26（木）	27（金）	28（土）
12月	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※2	8.93E-05 （最大）	1.06E-04 （最大）	7.93E-05 （最大）	9.26E-05 （最大）	8.47E-05 （最大）	6.60E-05 （最大）	8.99E-05 （最大）
		ND （最小）	ND （最小）	ND （最小）	ND （最小）	ND （最小）	ND （最小）	ND （最小）
	月	29（日）	30（月）	31（火）	1（水）	2（木）	3（金）	4（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※2	7.40E-05 （最大）	7.93E-05 （最大）	8.70E-05 （最大）	8.73E-05 （最大）	1.54E-04 （最大）	9.80E-05 （最大）	1.09E-04 （最大）
		ND （最小）	ND （最小）	ND （最小）	ND （最小）	ND （最小）	ND （最小）	ND （最小）
1月	月	5（日）	6（月）	7（火）	8（水）	9（木）	10（金）	11（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	○	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	○	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※2	9.55E-05 （最大）	9.80E-05 （最大）	1.06E-04 （最大）	1.17E-04 （最大）	9.52E-05 （最大）	1.14E-04 （最大）	8.20E-05 （最大）
		ND （最小）	ND （最小）	ND （最小）	ND （最小）	ND （最小）	ND （最小）	ND （最小）
	月	12（日）	13（月）	14（火）	15（水）	16（木）	17（金）	18（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※2	1.06E-04 （最大）	1.30E-04 （最大）	1.19E-04 （最大）	1.01E-04 （最大）	1.01E-04 （最大）	1.11E-04 （最大）	1.11E-04 （最大）
		ND （最小）	ND （最小）	ND （最小）	ND （最小）	ND （最小）	ND （最小）	ND （最小）
	月	19（日）	20（月）	21（火）	22（水）	23（木）	24（金）	25（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※2	1.07E-04 （最大）	1.09E-04 （最大）	1.65E-04 （最大）	1.43E-04 （最大）	1.30E-04 （最大）	1.06E-04 （最大）	1.41E-04 （最大）
		ND （最小）	8.27E-07 （最小）	ND （最小）	ND （最小）	6.75E-07 （最小）	ND （最小）	ND （最小）
	月	26（日）	27（月）	28（火）	29（水）	30（木）	31（金）	1（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※2	1.54E-04 （最大）	1.59E-04 （最大）	1.70E-04 （最大）	－ （最大）	－ （最大）	－ （最大）	－ （最大）
		ND （最小）	ND （最小）	ND （最小）	－ （最小）	－ （最小）	－ （最小）	－ （最小）

2025年1月29日時点
